

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2020/2021 RESERVATÓRIO CHAPÉU


OUTUBRO DE 2020

- Reuniões de Alocação de Água realizada nos dias 28/08/2020 e 21/09/2020, excepcionalmente por videoconferência em razão da pandemia de Covid-19, conforme Resolução CRH PE Nº 3 de 18/06/2020.

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, gpsi@apac.pe.gov.br / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

ESTADOS HIDROLÓGICOS / VOLUMES ESPERADOS E OBSERVADOS

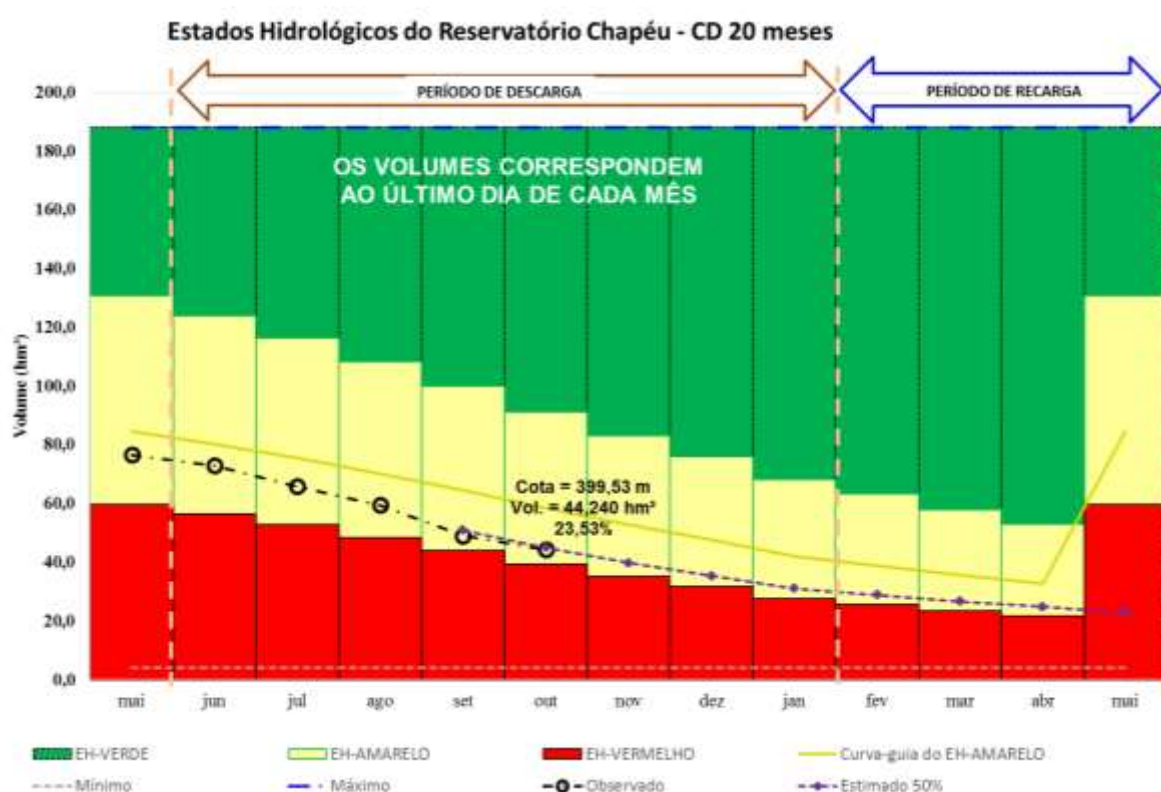

Cotas e Volumes Esperados e observados para o período de set/2020 a mai/2021

DATA	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm ³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm ³)
Set/2020	400,13	50,952	400,05	49,100
Out/2020	399,63	45,019	399,53	44,240
Nov/2020	398,98	39,767	-	-
Dez/2020	398,61	35,323	-	-
Jan/2021	398,26	31,062	-	-
Fev/2021	398,08	28,901	-	-
Mar/2021	397,35	26,697	-	-
Abr/2021	396,80	24,816	-	-
Mai/2021	396,43	22,599	-	-

Usos Acordados – Período: jul/2020 a jun/2021

Usos (L/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Usos de Jusante	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Perenização	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Total	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0

Usos Verificados – Período: ago/2019 a jul/2020

Usos (L/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-
Usos de Jusante	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-
Perenização	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-
Total	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-

SI – Sem Informação

COMPROMISSOS E AÇÕES

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1.	Monitoramento					
1.1	Leitura das réguas do reservatório	APAC	Diária			
1.2	Abertura e Fechamento da Comporta do reservatório e registro da leitura da régua com data e horário	SERH-PE	De acordo com as regras estabelecidas neste TAA			
1.3	Repassar a informação sobre a chegada da água na confluência com o riacho São Pedro	CONSU	Imediato (quando for o caso)			
2.	Instrumentação					
2.1	Revisão/instalação de réguas para medição linimétrica	APAC	Dezembro/2020			
3.	Regulação dos usos					
3.1	Batimetria a partir dos estudos do PE-3D	APAC	Outubro/2020			
4.	Outras ações					
4.1	Realizar manutenção na grade de proteção da comporta e instalar cadeados.	SERH-PE	Dezembro/2020			
4.2	Instalação de lances de réguas na barragem do Fomento (UFRPE-Parnamirim), para medições fluviométricas a jusante do açude Chapéu	APAC	Dezembro/2020 *Solicitar viabilidade à GRMF			
