

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2020/2021 RESERVATÓRIO CHAPÉU


JANEIRO DE 2021

- Reuniões de Alocação de Água realizada nos dias 28/08/2020 e 21/09/2020, excepcionalmente por videoconferência em razão da pandemia de Covid-19, conforme Resolução CRH PE Nº 3 de 18/06/2020.
-

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, gpsi@apac.pe.gov.br / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

ESTADOS HIDROLÓGICOS / VOLUMES ESPERADOS E OBSERVADOS*

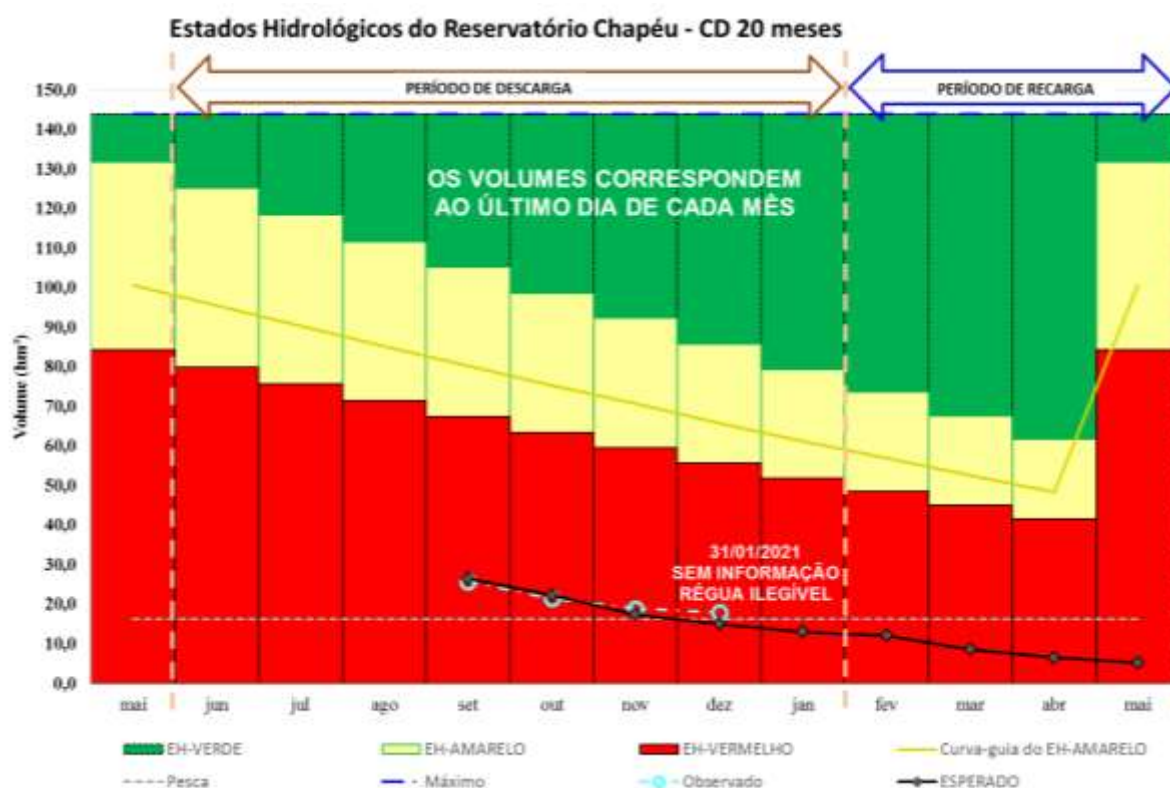

* Valores atualizados em função da CAV NOVA

Cotas e Volumes Esperados e observados para o período de set/2020 a mai/2021⁽¹⁾

DATA	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm ³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm ³)
Set/2020	400,13	26,546	400,05	25,803
Out/2020	399,63	22,281	399,53	21,455
Nov/2020	398,98	17,443	399,20	19,025
Dez/2020	398,61	15,097	399,06	18,006
Jan/2021	398,26	13,074	SI ⁽²⁾	SI ⁽²⁾
Fev/2021	398,08	12,081	-	-
Mar/2021	397,35	8,629	-	-
Abr/2021	396,80	6,490	-	-
Mai/2021	396,43	5,232	-	-

(1) Valores atualizados em função da CAV NOVA

(2) Sem Informação – Régua ilegível

Usos Acordados – Período: set/2020 a mai/2021

Usos (L/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Usos de Jusante	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Perenização	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Total	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0

Usos Verificados – Período: set/2020 a mai/2021

Usos (L/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
Usos de Jusante	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
Perenização	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-
Total	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-

SI – Sem Informação

COMPROMISSOS E AÇÕES

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1.	Monitoramento					
1.1	Leitura das régua do reservatório	APAC	Diária			
1.2	Abertura e Fechamento da Comporta do reservatório e registro da leitura da régua com data e horário	SERH-PE	De acordo com as regras estabelecidas neste TAA			
1.3	Repassar a informação sobre a chegada da água na confluência com o riacho São Pedro	CONSU	Imediato (quando for o caso)			
2.	Instrumentação					
2.1	Revisão/instalação de régua para medição limimétrica	APAC	Dezembro/2020			
3.	Regulação dos usos					
3.1	Batimetria a partir dos estudos do PE-3D	APAC	Outubro/2020			
4.	Outras ações					
	Realizar manutenção na grade de	SERH-PE	Dezembro/2020			

4.1	proteção da comporta e instalar cadeados.					
4.2	Instalação de lances de réguas na barragem do Fomento (UFRPE-Parnamirim), para medições fluviométricas a jusante do açude Chapéu	APAC	Dezembro/2020 *Solicitar viabilidade à GRMF			

OBSERVAÇÕES:

Em 06/01/2021 houve uma reunião extraordinária por videoconferência, solicitada pelo CONSU Chapéu, cuja Pauta foi a liberação de água para os usuários de jusante, devido a situação de escassez.

Durante a reunião, foi informada a atualização da CAV através da utilização do PE-3D (conforme um dos encaminhamentos do atual Termo de Alocação). Segundo a CAV NOVA, o volume máximo atual do reservatório Chapéu é de 143,993 hm³. Isto representa uma redução de 23,41% em relação à capacidade máxima anterior.

Os Valores de volumes, constantes neste boletim, foram ajustados em função da CAV NOVA, ou seja, foram mantidos os valores referentes às cotas e ajustados novos volumes a estas informações.

Foi proposta, com o aval do CONSU Chapéu, a cota mínima na qual é possível se trabalhar com a PESCA, sem comprometimento desta atividade, ou seja, COTA MÍNIMA PARA PESCA = 398,80 m.

Foi decidido pela maioria dos participantes da reunião extraordinária do dia 06/01/2021, uma liberação de 5,715 hm³ do açude Chapéu, em relação ao volume referente à cota registrada no dia 05/01/2021. **FICOU AINDA ESTABELECIDO NA REFERIDA REUNIÃO, QUE A COMPORTA DO AÇUDE SERÁ FECHADA QUANDO A COTA REGISTRAR O VALOR DE 398,07 m.**

O representante da SERH-PE atribuiu à coordenadora do CONSU Chapéu, a responsabilidade pela manobra da comporta do reservatório.

A comporta do reservatório foi aberta na manhã do dia 07/01/2021, na cota = 399,00 m e volume = 17,570 hm³.

P. S.: SE A ÁGUA LIBERADA CHEGAR A CONFLUÊNCIA COM O RIACHO SÃO PEDRO (antes de atingir a cota e volumes estabelecidos na reunião do dia 06/01/2021), A COMPORTA DO RESERVATÓRIO TAMBÉM DEVERÁ SER FECHADA.

A última leitura da régua do reservatório foi em 08/01/2021, na cota 399,00. A estaca 398 encontra-se com a régua ilegível. A equipe do monitoramento da APAC estará realizando a substituição da régua antiga por uma nova, na segunda semana de fevereiro de 2021.
