

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2020/2021 RESERVATÓRIO CHAPEÚ


MAIO DE 2021

- Reuniões de Alocação de Água realizada nos dias 28/08/2020 e 21/09/2020, excepcionalmente por videoconferência em razão da pandemia de Covid-19, conforme Resolução CRH PE Nº 3 de 18/06/2020.

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, gpsi@apac.pe.gov.br / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

ESTADOS HIDROLÓGICOS / VOLUMES ESPERADOS E OBSERVADOS*

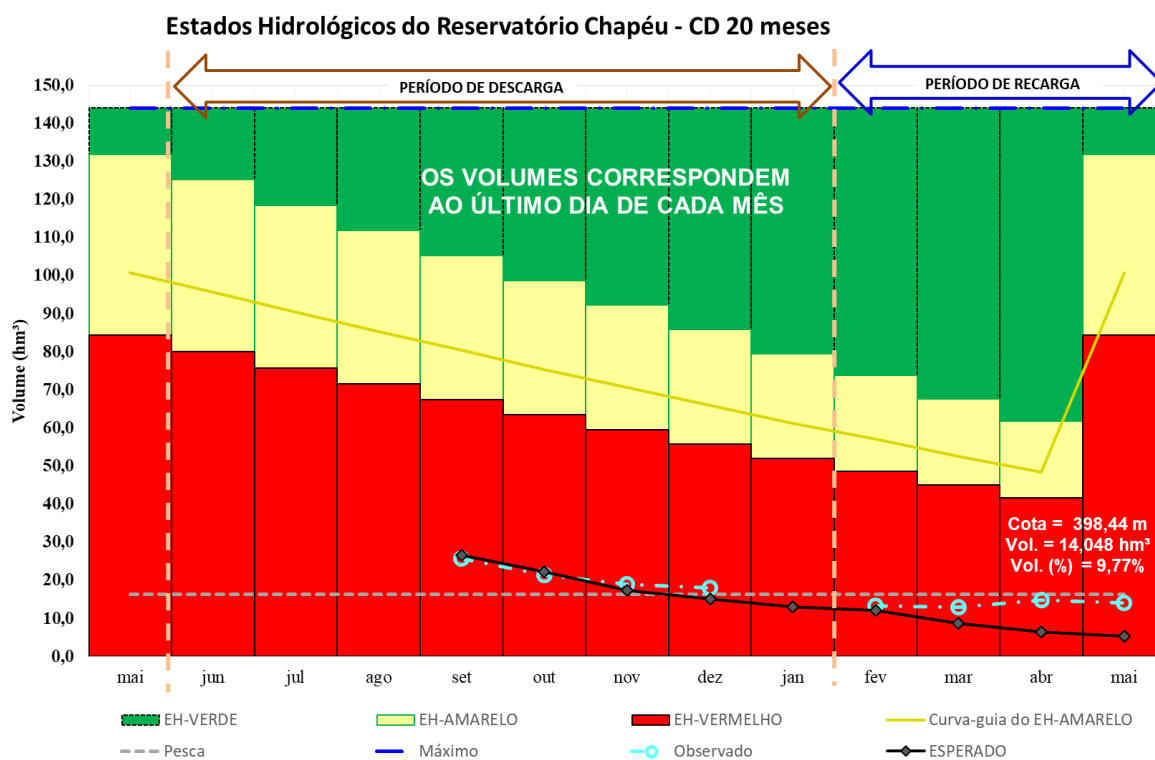

* Valores atualizados em função da CAV NOVA

Cotas e Volumes Esperados e observados para o período de set/2020 a mai/2021⁽¹⁾

DATA	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm ³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm ³)
Set/2020	400,13	26,546	400,05	25,803
Out/2020	399,63	22,281	399,53	21,455
Nov/2020	398,98	17,443	399,20	19,025
Dez/2020	398,61	15,097	399,06	18,006
Jan/2021	398,26	13,074	SI ⁽¹⁾	SI ⁽¹⁾
Fev/2021	398,08	12,081	398,30	13,295
Mar/2021	397,35	8,629	398,25	13,019
Abr/2021	396,80	6,490	398,56	14,780
Mai/2021	396,43	5,232	398,44	14,048

Valores atualizados em função da CAV NOVA

(1) Sem Informação – Régua ilegível

Usos Acordados – Período: set/2020 a mai/2021

Usos (L/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Usos de Jusante	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Perenização	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Total	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0

Usos Verificados – Período: set/2020 a mai/2021

Usos (L/s)	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Usos de Jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Perenização	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Total	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

SI – Sem Informação

COMPROMISSOS E AÇÕES

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1.	Monitoramento					
1.1	Leitura das réguas do reservatório	APAC	Diária			
1.2	Abertura e Fechamento da Comporta do reservatório e registro da leitura da régua com data e horário	SERH-PE	De acordo com as regras estabelecidas neste TAA			
1.3	Repassar a informação sobre a chegada da água na confluência com o riacho São Pedro	CONSU	Imediato (quando for o caso)			
2.	Instrumentação					
2.1	Revisão/instalação de réguas para medição linimétrica	APAC	Dezembro/2020			
3.	Regulação dos usos					

3.1	Batimetria a partir dos estudos do PE-3D	APAC	Outubro/2020			
4.	Outras ações					
4.1	Realizar manutenção na grade de proteção da comporta e instalar cadeados.	SERH-PE	Dezembro/2020			
4.2	Instalação de lances de régua na barragem do Fomento (UFRPE-Parnamirim), para medições fluviométricas a jusante do açude Chapéu	APAC	Dezembro/2020 *Solicitar viabilidade à GRMF			
