

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2021/2022 RESERVATÓRIO CHAPÉU

JULHO DE 2021

- Reunião de Alocação de Água realizada nos dias 18/06/2021, excepcionalmente por videoconferência em razão da pandemia de Covid-19, conforme Resolução CRH PE Nº 3 de 18/06/2020.

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, gpsi@apac.pe.gov.br / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

ESTADOS HIDROLÓGICOS / VOLUMES ESPERADOS E OBSERVADOS

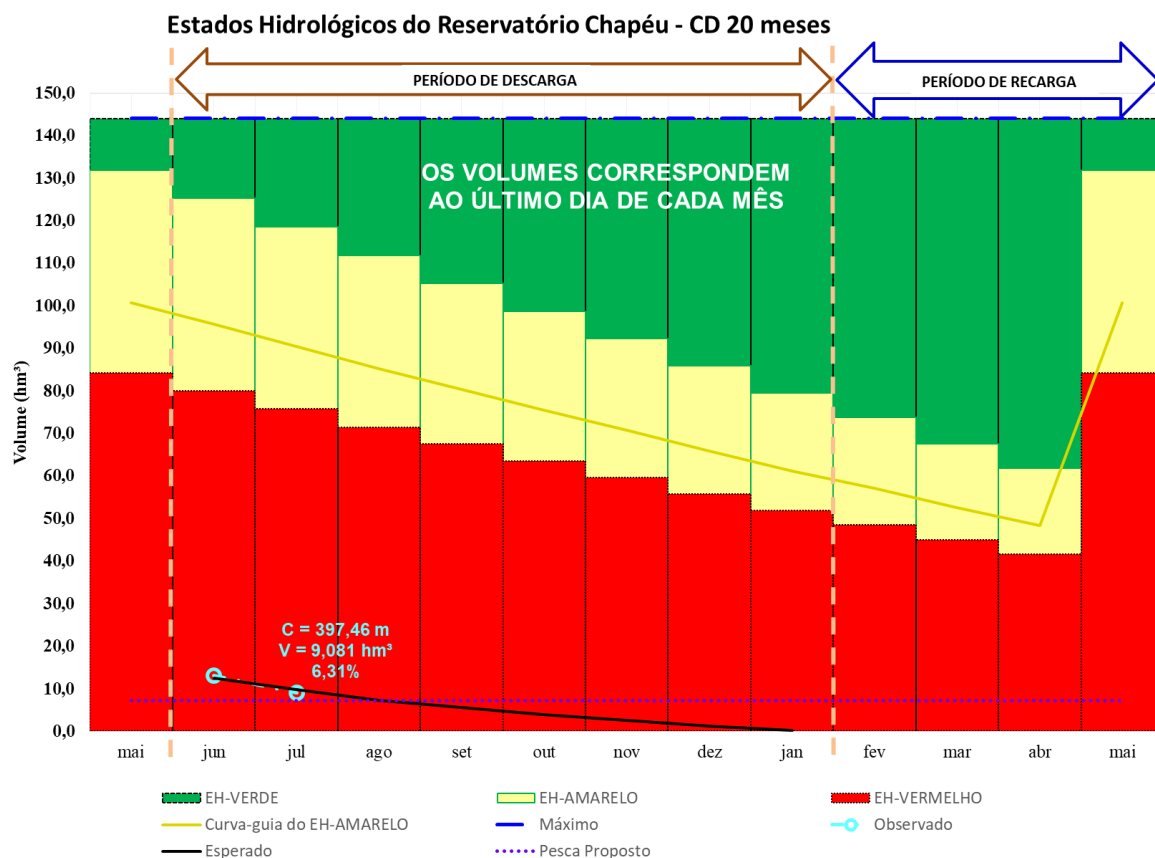


Tabela 1 - Cotas e Volumes mínimos esperados e Cotas e Volumes observados (ao final de cada mês) para o período de jun/2021 a mai/2022

DATA	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
Jun/2021	398,17	12,575	398,26	13,074
Jul/2021	397,63	9,867	397,46	9,081
Ago/2021	397,02	7,292	-	-
Set/2021	396,54	5,560	-	-
Out/2021	395,98	3,935	-	-
Nov/2021	395,34	2,512	-	-
Dez/2021	394,53	1,218	-	-
Jan/2022	393,16	0,158	-	-
Fev/2022	392,00	0,0	-	-
Mar/2022	392,00	0,0	-	-
Abr/2022	392,00	0,0	-	-
Mai/2022	392,00	0,0	-	-

Usos Acordados – Período: jun/2021 a mai/2022

Usos (L/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Usos de Jusante	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perenização	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	325,0	325,0	325,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0

Usos Verificados – Período: jun/2021 a mai/2022

Usos (L/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Usos de Montante	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usos de Jusante	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perenização	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SI – Sem Informação

COMPROMISSOS E AÇÕES

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1.	Monitoramento					
1.1	Leitura das réguas do reservatório	APAC	Diária			
1.2	Abertura e Fechamento da Comporta do reservatório e registro da leitura da régua com data e horário	SERH-PE	De acordo com as regras estabelecidas neste TAA			
1.3	Repassar a informação sobre a chegada da água na confluência com o riacho São Pedro	CONSU	Imediato (quando for o caso)			
2.	Instrumentação					

2.1	Revisão/instalação de réguas para medição linimétrica	APAC	Janeiro/2022			
3.	Regulação dos usos					
3.1	Envio à APAC de planilha com autodeclaração dos usuários de montante e jusante com o objetivo de realizar a outorga coletiva*	CONSU/ Usuários	Janeiro/2022			
4.	Outras ações					
4.1	Informar as coordenadas geográficas dos barramentos existentes no rio Brígida entre o açude Chapéu e a confluência com o riacho São Pedro	Prefeitura de Parnamirim	Dezembro/2021			

***Encaminhar planilha para o E-mail: protocolo@apac.pe.gov.br**

OBSERVAÇÕES:

1. A descarga de fundo do reservatório foi aberta em 29/06/2021, na cota = 398,29 m e volume = 13,240 hm³;
2. Conforme pode ser observado na Tabela 1, a cota em 31/07/2021 foi de 397,46 m. Segundo informações do Sr. Antônio Erenilton e da Sr^a Luzete, a água liberada pelo reservatório esta próxima a chegar no limite estabelecido. Diante disto, foi decidido deixar a descarga de fundo aberta até a data limite de 06/08/2021, respeitando-se porém, a cota estabelecida para pesca de 397,00 m.
3. **CONCLUSÃO - A DESCARGA DE FUNDO DEVERÁ SER FECHADA QUANDO FOR OBSERVADA UMA DESSAS 3 SITUAÇÕES (A QUE OCORRER PRIMEIRO):**
 - a) QUANDO A ÁGUA CHEGAR NO LIMITE, ENTRE A CONFLUÊNCIA DO BRÍGIDA COM O RIACHO SÃO PEDRO;
 - b) NA DATA 06/08/2021;
 - c) A COTA OBSERVADA NO RESERVATÓRIO FOR DE 397,00 m (pesca).
